

नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्धी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना  
परियोजना व्यवस्थापन इकाई

आ.व. २०७५/७६ को तृतीय चौमासिक  
र बार्षिक कार्यक्रमको प्रगती  
प्रतिवेदन

डा. रेवती रमण पौडेल  
परियोजना निर्देशक

# प्रस्तुतिका विषयहरू

## विषय

- ✓ परियोजनाको परिचय
- ✓ एकमुष्ठ भारित तथा वित्तीय विवरण
- ✓ आयोजना/कार्यक्रमगत उपलब्धीहरू
- ✓ बेरुजू फछ्यौट एवं राजस्व संकलन विवरण
- ✓ विशेष पहलमा भएका नविनतम कार्यहरू
- ✓ अनुदानको विवरण
- ✓ प्रगती नपुगका कारणहरू
- ✓ महत्वपूर्ण सिकाईहरू
- ✓ मुख्य समस्याहरू
- ✓ राजश्व संकलन विवरण
- ✓ आयोजनाको Result framework अनुसारको सूचकहरूमा उपलब्धी
- ✓ अन्य तथ्यांकीय विवरण
- ✓ कार्यक्रमका झलकहरू

# प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोच सहित यो परियोजना कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालयबाट संचालन हुने गरि सुरु भएको हो।

परियोजना अवधि: २०७३ श्रावण - २०८२ असार (१० वर्ष )

परियोजनाको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य:

- प्रमुख कृषि उपजहरूको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने
- निर्यातयोग्य कृषि वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
- कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यावसायका रूपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र
- बहुसरोकारवाला निकायहरू बीचको कार्यमूलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने।

# मूल्य श्रृंखलामा समावेश गरिएका वालीहरुमा संचालनमा रहेका परियोजना

प्रदेश	जोन	सुपर जोन
प्रदेश नं.१ (२०)	भापा (रबर, सुपारी), इलाम (किवी), पाँचथर (अलैंची), भापा (धान ) ताप्लेजुङ्ग (अलैंची), मोरङ्ग (धान, माछा), सुनसरी (अदुवा वेसार, माछा, धान) भोजपुर (अलैंची), धनकुटा (तरकारी), संखुवासभा (अलैंची), उदयपुर (सुन्तला, अदुवा वेसार), खोटाङ्ग (मकै), ओखलढुगा (आलु), सोलु (सुन्तला, अदुवा वेसार)	
प्रदेश नं. २ (८)	सप्तरी (आँप), सिरहा (धान), धनुषा (धान), सर्लाही धनुषा (माछा), (धान), रौतहट (तरकारी), पर्सा (तरकारी)	बारा (माछा)

# मूल्य श्रृंखलामा समावेश गरिएका वालीहरुमा संचालनमा रहेका परियोजना

प्रदेश	जोन	सुपर जोन
प्रदेश नं. ३ (१३)	दोलखा (किवी), सिन्धुपाल्चोक (मकै), मकवानपुर ( सिन्धुली (जुनार), तरकारी), भक्तपुर (आलु), नुवाकोट (तरकारी, काख्रे (आलु) आलु), धादिङ (तरकारी, मकै), चितवन (तरकारी मौरी, केरा)	
गण्डकी प्रदेश (१२)	गोरखा (सुन्तला), तनहुँ (तरकारी), लम्जुङ (अलैंची), कास्की (तरकारी) नवलपुर (सुन्तला), पाल्पा (तरकारी), मुस्ताङ ( स्याङ्जा (सुन्तला) स्याउ), मनाङ (स्याउ), पर्वत (मकै), म्यागदी ( सुन्तला), बाग्लुङ (आलु) रुकुम पूर्व (ओखर)	

# मूल्य श्रृंखलामा समावेश गरिएका वालीहरुमा संचालनमा रहेका परियोजना

प्रदेश	जोन	सपुर जोन
प्रदेश नं. ५ (१५)	दाङ (तोरी), कपिलबस्तु (धान, तरकारी), गुल्मी ( दाङ (मकै) मकै, सुन्तला), प्यूठान (धान), अर्घाखाँची (तरकारी), कपिलबस्तु (धान) रुपन्देही (माछा), रोल्पा (मकै), रुकूम पश्चिम ( गुल्मी (कफी) तरकारी), बाँके (मकै)	
कर्णाली प्रदेश (७)	सल्यान (अदुवा वेसार) जाजरकोट (सुन्तला), दैलेख जुम्ला (स्याउ) (सुन्तला), कालिकोट (स्याउ), सुर्खेत (अदुवा वेसार)	
सुदूर पश्चिम प्रदेश (८)	अछाम (आलु), बाजुरा (जैतुन), बैतडी (मकै), कैलाली (गहुँ) दार्चुला (स्याउ ) कन्चनपुर (धान)	डडेल्धुरा (आलु)

# पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनको संख्या

संभाग	आ.व. ०७३/७४	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६	शुरु देखि हाल सम्मको				
	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति		
पकेट	२१००	२१००	१४३३	२०२३	१४३३	२७७६	४९६६	२७७६
ब्लक	१५०	१५०	१५०	१४६	१५०	३३६	४५०	३३६
जोन	३०	३०	३०	३९	३०	६९	९०	६९
सुपर जोन	७	७	१	१०	१	१४	९	१४
जम्मा	२२८७	२२८७	१६१४	२२१८	१६१४	३१९५	५५१५	३१९५

# प्रदेश र परियोजना संख्या

प्रदेश	पकेट	ब्लक	जोन	सुपरजोन	जम्मा
प्रदेश नं. १	५४६	६८	१९	१	६३४
प्रदेश नं. २	४९८	३९	६	२	५४६
प्रदेश नं. ३	४७५	५७	११	२	५४५
गण्डकी	३१०	४७	१०	२	३६८
प्रदेश नं. ५	५२६	५७	११	४	६००
कर्णाली	१६६	३५	६	१	२०७
सुदूर पश्चिम	२५५	३३	६	२	२९५
जम्मा	२७७६	३३६	६९	१४	३१९५

# परियोजना संभागहरूको संचालन स्थिती

सूचक	इकाई	पकेट	ब्लक	जोन	सुपरजोन
परियोजना अवधि लक्ष्य	संख्या	१५०००	१५००	३००	२१
आ.व. २०७५।७६ सम्मको लक्ष्य प्रगति	संख्या	४५०० (२७२४)	४५० (३३६)	९० (६९)	९ (१४)
घटी वढी परियोजना	संख्या	- १७७६	- ११४	- २१	५
औषत विनियोजन (आ.व. २०७५।७६ )	रु.हजार	२८१	२२७९	१७२७९	३२१९०
औषत विनियोजन (आ.व. २०७५।७६)	रु.हजार	??	??	१४१२४	२९६९६

## प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको दायित्व

१. उन्नत कृषि प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको व्यवस्था, वाली वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता क्रियाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य हासिलका लागि कृषि विकास रणनीति (ADS) कार्यान्वयनमा सहयोग पुऱ्याउने ।
२. नेपालको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गराउने सहयोग पुऱ्याउने ।
३. कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रीकरण गराउने सहयोग पुऱ्याउने ।
४. निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकरण गराउने सहयोग पुऱ्याउने ।
५. कृषि क्षेत्रमा आयात न्यूनीकरण तथा निर्यात प्रवर्द्धन गराउने सहयोग पुऱ्याउने ।
६. युवा जनशक्तिलाई कृषि पेशमा आकर्षित गराउने सहयोग पुऱ्याउने ।
७. जलवायु अनकुलन प्रविधिहरू विकास तथा विस्तार गराउने सहयोग पुऱ्याउने ।
८. कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न नीजी क्षेत्रलाई आकर्षित गराउने सहयोग पुऱ्याउने ।
९. कृषि उत्पादनको मध्यमबाट ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण र शहरी क्षेत्रमा बसोबार गर्ने जनताहरूको लागि खाद्य तथा पोषक कृषि उत्पादनको उपलब्धता सहज बनाउन सहयोग पुऱ्याउने ।

# पकेट, ब्लक, जोन, सुपर जोन अन्तरगत संचालन हुने क्रियाकलापहरू

पकेट २	ब्लक ४	जोन ४	सुपर जोन ५
<b>१ उत्पादन कार्यः</b> कृषिवस्तुहरूको उत्पादन	<b>१ उद्घम विकास कार्य</b> प्राथमिक व्यवसाय विकास	<b>१ बजारीकरण कार्यः</b> कृषि उद्योगजन्य उद्योगका पदार्थको बजारीकरण	<b>१ औद्योगिक कार्यः</b> अन्तिम रूपमा उपभोग्य वस्तुको उत्पादन
<b>२ प्रविधि प्रसार कार्यः</b> नविनतम कृषि प्रविधिको प्रसार	<b>२ उत्पादकत्व प्रवर्द्धन कार्यः</b> उत्पादकत्व अभिवृद्धि	<b>२ प्रशोधन कार्यः</b> उद्योग संचालनका आवश्यक कच्चा उत्पादनका प्राथमिकता	<b>२ अनुसन्धान कार्यः</b> नव प्रवर्तन तथा अनुसन्धान
<b>३ मानव श्रोत व्यवस्थापन कार्यः</b> कृषि उद्घम विकास	<b>३ प्रशोधन भण्डारण कार्यः</b> संकलन केन्द्र	<b>३ शैक्षिक कार्यः</b> मानव संशाधन विकास (कृषि प्राविधिक र उद्घमी)	<b>४ बजारीकरण कार्यः</b> प्रशोधित उपजको बजारीकरण
<b>४ प्रदर्शन तथा हस्तान्तरण कार्यः</b> सहभागितात्मक उत्पादन प्रदर्शन	<b>४ श्रोत केन्द्र विकास कार्यः</b> उत्पादन सामग्री उत्पादन व्यवसायिक	<b>५ नियामक कार्यः</b> गुणस्तर नियन्त्रण र अनुसन्धान	

# आ.व. २०७६।७७ को लागि थप भएको जोन संख्या (३९)

प्रदेश	जोन संचालन नभएका जिल्लाहरु (१४)	स्थानीय र राष्ट्रिय महत्वका सम्भाव्य वालीहरु (१७)	पशुपन्ची तर्फ (८)	थप
प्रदेश नं.१	तेहथुम (अलैची)	झापा (मकै), सुनसरी (तरकारी), सोलु (किवी)	इलाम (गाई) सुनसरी (वंगुर)	६
प्रदेश नं.२	महोत्तरी (माछा र तरकारी)	सिरहा (आँप), रौतहट (धान बीउ)	सप्तरी (भैसी)	५
प्रदेश नं.३	रामेछाप (जुनार, आलु), रसुवा (आलु), काठमाण्डौ (आलु), ललितपुर (तरकारी)	उदयपुर (बहुबाली) चितवन (धान)	रामेछाप (बाखा)	८
गण्डकी प्रदेश		गोरखा (धान), स्याङ्जा (मसला वाली) नवलपुर (तरकारी), पर्वत (धान)	म्यागदी (वंगुर)	५
प्रदेश नं. ५	नवलपरासी (गहुँ)	दाङ (मौरी)	अर्धाखाँची (बाखा)	३
कर्णाली प्रदेश	हुम्ला (स्याउ), डोल्पा (स्याउ), मुगु (सिमी),	सुर्खेत (तरकारी), जाजरकोट(मौरी), सल्यान (धान), दैलेख (आलु)	दैलेख (वाखा)	८
सुदूर प्रदेश	पश्चिम बझाङ (आलु) डोटी (अदुवा वेसार)	डडेल्धुरा (भटमास)	अछाम (बाखा)	४

# प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

बजेट विनियोजन र वित्तीय प्रगति

# प्रदेश र बजेट विनियोजन (रु.हजारमा)

प्रदेश	पकेट	ब्लक	जोन	सुपरजोन	जम्मा	प्रतिशत
प्रदेश नं. १	१५९०००	१५९०००	२९७१८५	३६६५६	६५१८४१	२०.४३
प्रदेश नं. २	१३३५००	११९०००	१२०१८६	९३७८५	४६६४७१	१४.६२
प्रदेश नं. ३	१३०७००	१३७५००	२०२१८५	६६६५३	५३७०३८	१६.८३
गण्डकी	९७४००	११३५००	१३३३६४	५३१३७	३९७४०१	१२.४६
प्रदेश नं. ५	१४१८००	११४५००	२३२६४८	९९१५५३	६००५०१	१८.८२
कर्णाली	४८२००	६२०००	१०६५३५	३०५८१	२४७३१६	७.७५
सुदूर पश्चिम	७०५००	६०५००	१००१८६	५८२९६	२८९४८२	९.०७
जम्मा	७८११००	७६६०००	११९२२८९	४५०६६१	३१९००५०	१००.००

## प्रदेश र बजेट खर्च (रु.हजारमा)

प्रदेश	पकेट	ब्लक	जोन	सुपरजोन	जम्मा
प्रदेश नं. १	??	??	२३९४८३	३५१९५	
प्रदेश नं. २	??	??	९०३४०	८८५६६	
प्रदेश नं. ३	??	??	१७२९०८	५३९३१	
गण्डकी	??	??	१०२५४५	४५४३०	
प्रदेश नं. ५	??	??	२१७५८४	१०६१३०	
कर्णाली	??	??	७९९६९	४२६९२	
सुदूर पश्चिम	??	??	७१७६७	४२६९२	
जम्मा	??	??	९७४५९६	४१४६३६	

# परियोजना संभाग र बजेट खर्च (रु.हजारमा)


संभाग	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत
पकेट	७८११००	??	??
ब्लक	७६६०००	??	??
जोन	११९२२८९	९७४५९६	८१.७
सुपर जोन	४५०६६१	४९४६३६	९२.०१
जम्मा	३१९००५०	१३७४९९२	

# परियोजनमा संलग्न निकाय र वित्तीय प्रगति (रु.हजारमा)

संलग्न निकाय	विनियोजन रु.	खर्च रु.	खर्च प्रतिशत
जोन इकाइ	११९२२८९	९७४५९६	८१.७
सुपरजोन इकाइ	४५०६६९	४१४६३६	९२.०१
परियोजना व्याइकाइ	१३३४४७२	३०४७६७	२२.८
सिंचाई विभाग	१७००२०	१४८३४६	८७.२५
कृषि विभाग	१५२१	१२२	८.०२
खाद्य विभाग	२९९९०	५११८	१७.०७
उद्योग मन्त्रालय	१५७४७	०	०
नेकृअप	३५७००	१२७४	३.५७
जम्मा	३२३४०००	१८४८८५९	५७.१७


# परियोजनाको तुलनात्मक बार्षिक विनियोजन (रु.हजारमा)

विगत ३ वर्षको तुलनात्मक बजेट

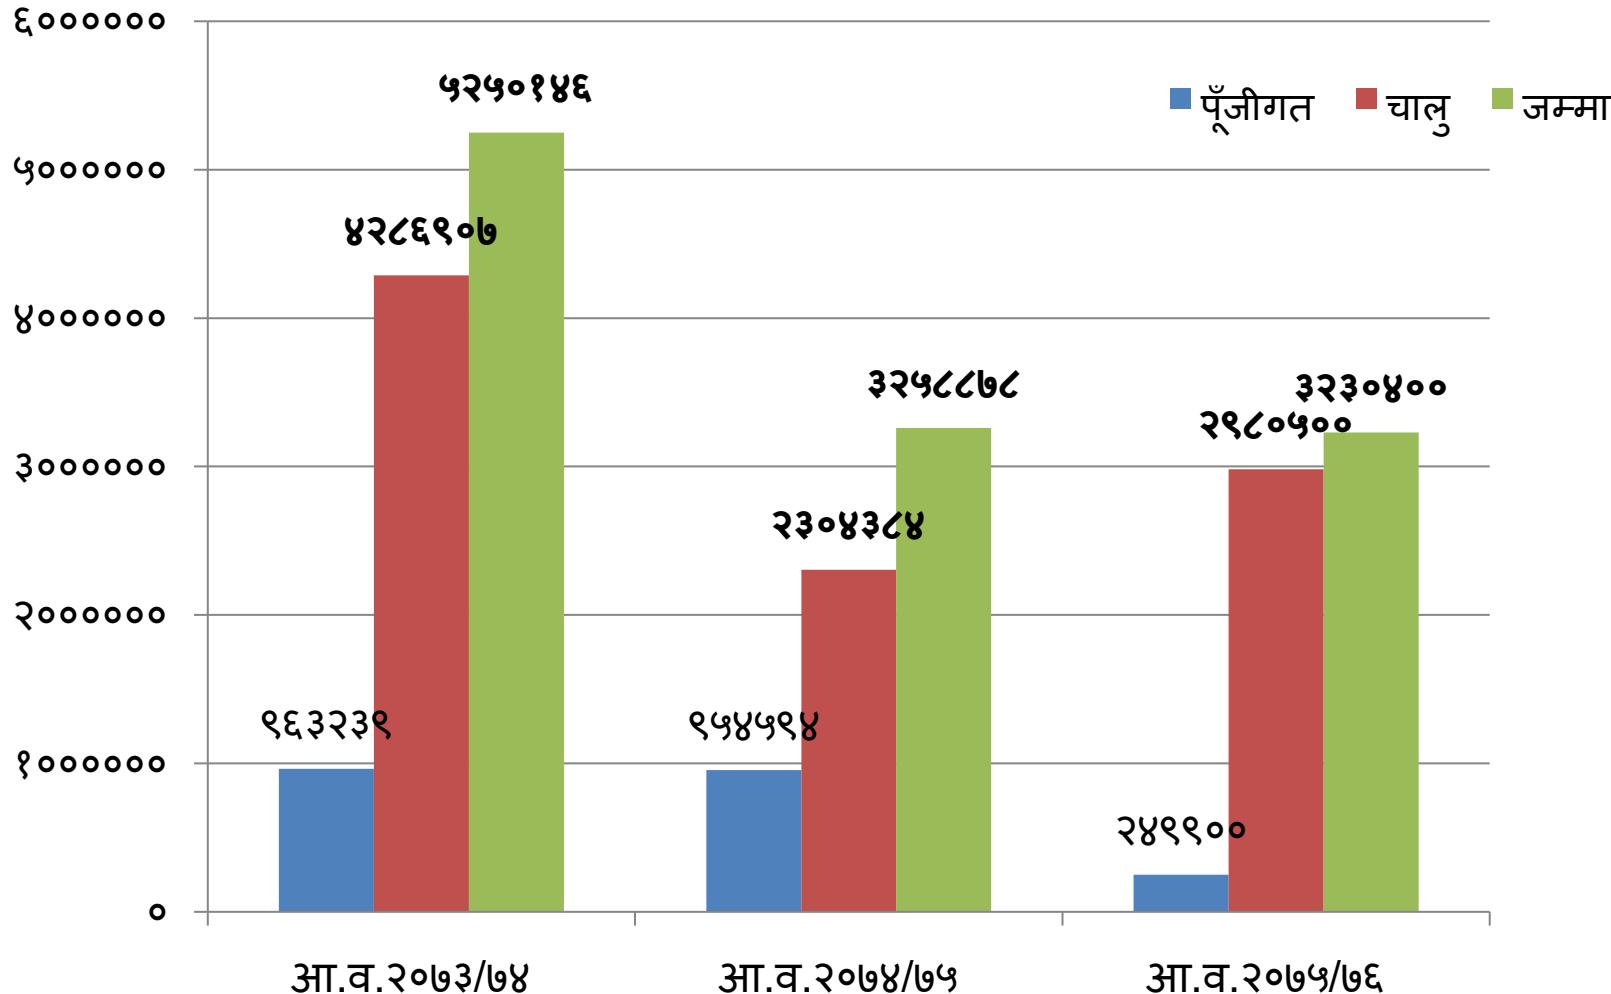


# परियोजनाको वित्तीय खर्च रकम (रु.लाखमा)

विगत ३ वर्षको तुलनात्मक

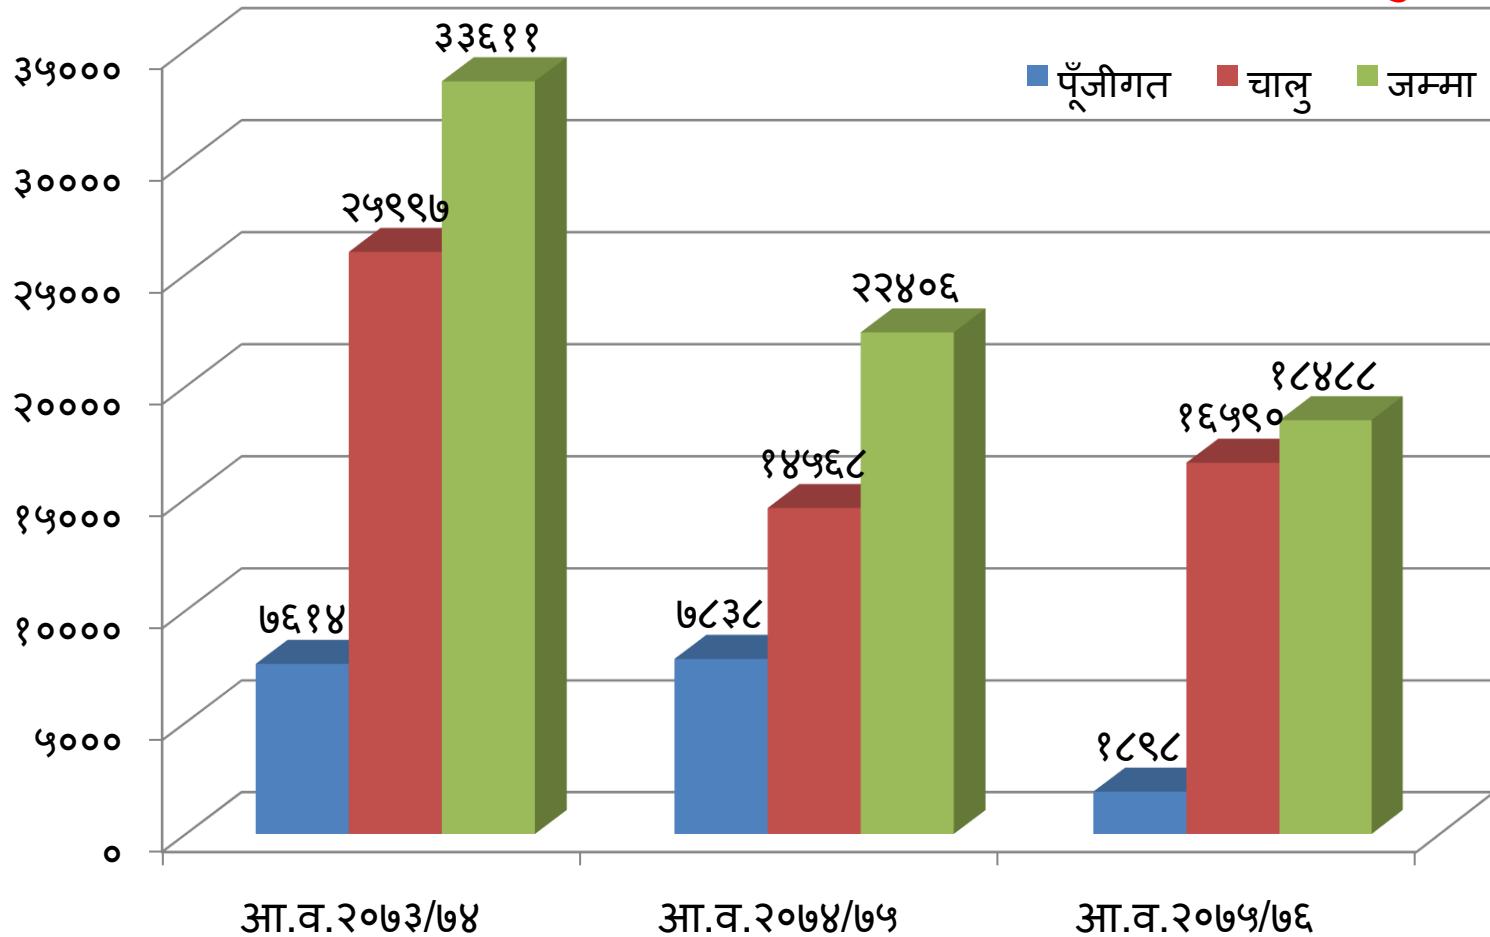

# परियोजनाको वित्तीय प्रगति प्रतिशत

विगत ३ वर्षको तुलनात्मक

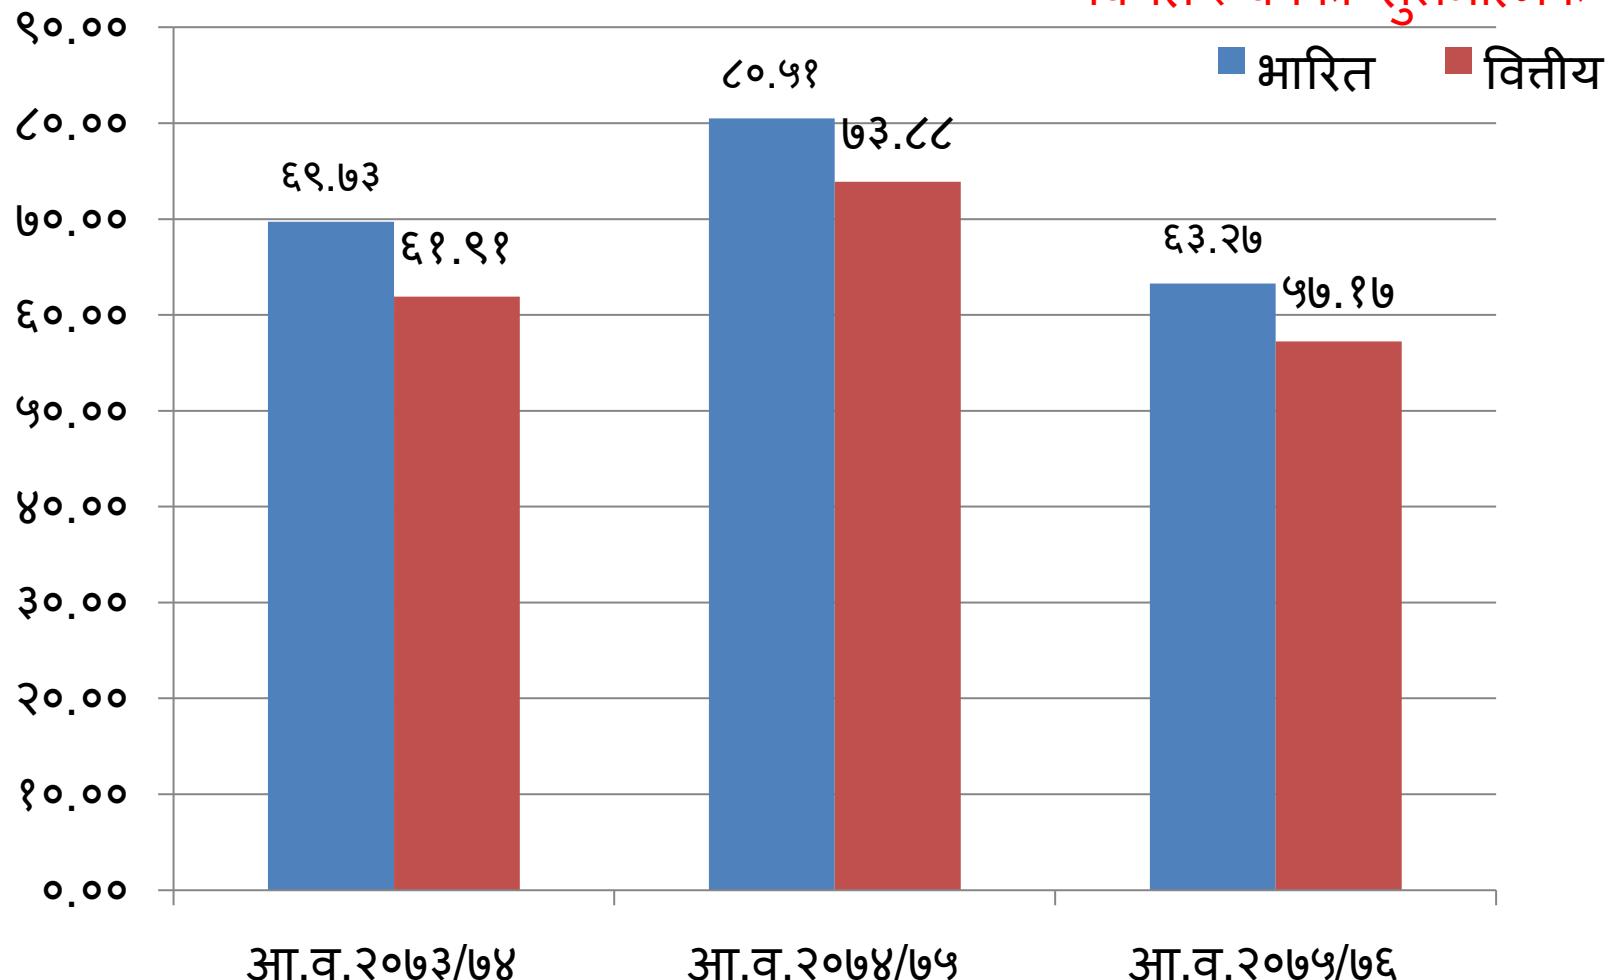


# प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना व्यवस्थापन इकाई

बजेट विनियोजन र वित्तीय प्रगति


# परियोजना व्यवस्थापन इकाइको तुलनात्मक बार्षिक विनियोजन (रु.हजारमा)

विगत ३ वर्षको तुलनात्मक

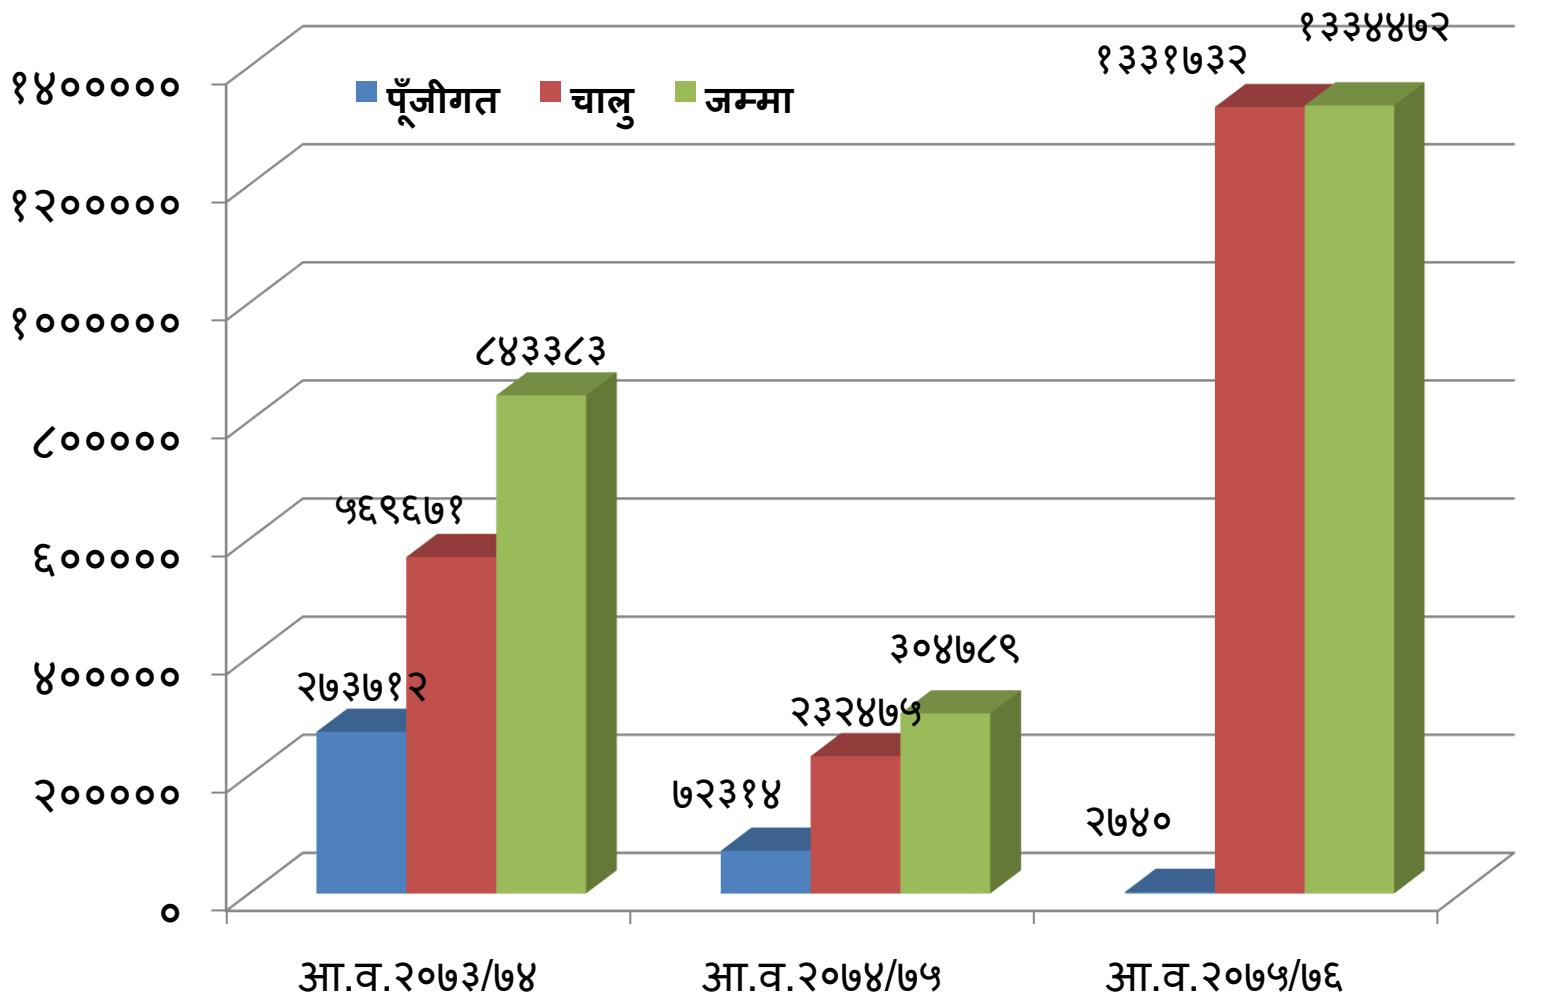


# परियोजना व्यवस्थापन इकाइको वित्तीय खर्च रकम (रु.हजारमा)

विगत ३ वर्षको तुलनात्मक

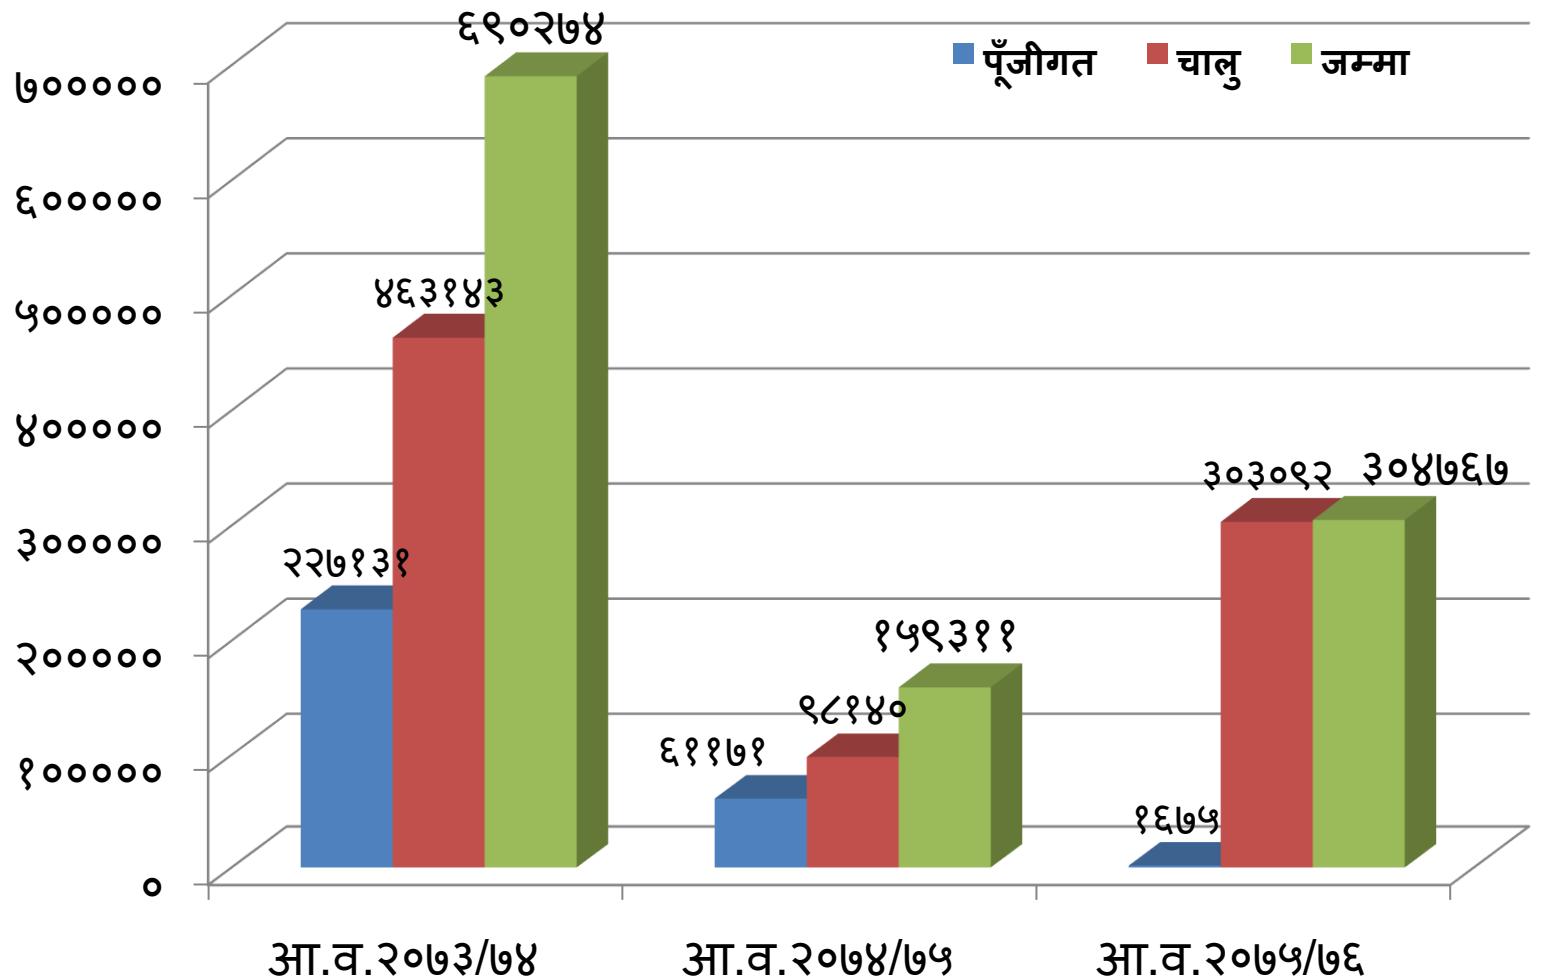

# परियोजना व्यवस्थापन इकाइको भारित तथा वित्तीय प्रगति प्रतिशत

विगत ३ वर्षको तुलनात्मक

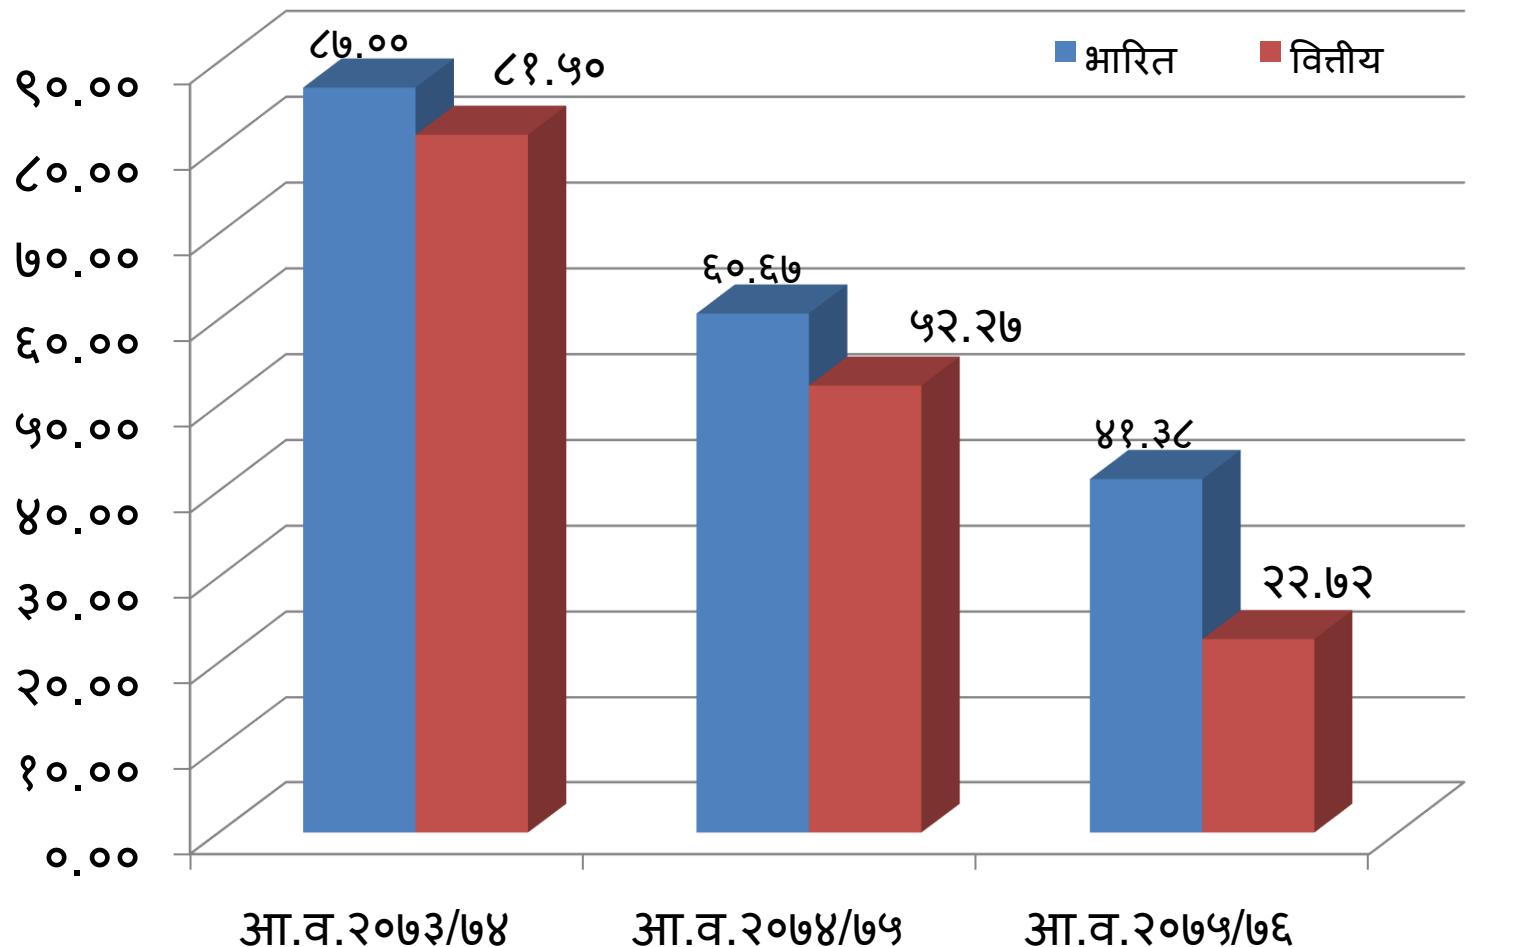

प्रतिवेदन अवधि सम्म सम्पन्न मूख्य मूख्य  
गतिविधिहरु

# प्रतिवेदन अवधिसम्म सम्पन्न मूल्य मूल्य गतिविधिहरु

क्र स	कार्यक्रम	इकाइ	आ.व. २०७४/७५ सम्म सम्पन्न प्रगति	आ.व. २०७५/७६ को प्रगति	हालसम्मकी प्राप्त उपलब्धि
क)	उत्पादन वृद्धिसंग सम्बन्धित				
१	साना सिंचाई निर्माण	हेक्टर	४२२	१२७८	१७००
२	सौर सिंचाई	हेक्टर		३५	३५
३	माछा पोखरी निर्माण	हेक्टर	१४०५	३८२	१७८७
४	मत्स्य पोखरी मर्मत सुधार	हेक्टर	२५		२५
५	रेन्बो ट्राउट रेसवे	संख्या	६८		६८
६	मत्स्य ह्याचरी	संख्या	८		८
७	हाइटेक ग्रिन हाउस	संख्या	७	३	१०
८	सेमी हाइटेक ग्रिनहाउस	संख्या	५६	३०	८६
९	फलफल विरुद्ध उत्पादक आधुनिक नर्सरी	संख्या	८		८
१०	टिस्यु कल्चर ल्याब स्थापना	संख्या	२		२

# प्रतिवेदन अवधिसम्म सम्पन्न मूल्य मूल्य गतिविधिहरु

क्र स	कार्यक्रम	इकाइ	आ.व. २०७४/७५ सम्मको प्रगति	आ.व. २०७५/७६ को प्रगति	हालसम्म प्राप्त उपलब्धि
क)	उत्पादन वृद्धिसंग सम्बन्धित				
११	भकारो सुधार	संख्या	२००	३०८२	३२८२
१२	प्रांगारिक मल/भर्मी कम्पोष्ट/हरियो मल/जैविक मल प्रदर्शन	संख्या		२१६	२१६
१३	उन्नत प्रविधि प्रदर्शन	संख्या	७१	२२५	२९६
१४	हाइटेक नर्सरी - फलफुल	संख्या	९	१३	२२
१५	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	हेक्टर	१६७०२	१८०६३	३४७६५
१६	जैविक विषादी उत्पादन कारखाना	संख्या	४	४	८
१७	प्राङ्गारिक मल कारखाना	संख्या	६	१	७

# प्रतिवेदन अवधिसम्म सम्पन्न मूल्य मूल्य गतिविधिहरु

क्र स	कार्यक्रम	इकाइ	आ.व. २०७४/७५ सम्म सम्पन्न प्रगति	आ.व. २०७५/७६ को प्रगति	हालसम्म प्राप्त उपलब्धि
ख	लागत न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित				
१	कस्टम हायरिङ सेन्टर	संख्या	४२५	७२	४९७
२	साना मेशनरी औजार	संख्या		५७०	५७०
ग	मूल्य श्रेखंला अभिवृद्धि र बजार ब्यवस्थापन सँग सम्बन्धित				
१	पोष्ट हार्डेष्ट सेन्टर स्थापना	संख्या	२६५	७१	३३६
२	TMR उद्योग निर्माण तथा संचालन	संख्या		१	१
३	आलु चिप्स उद्योग	संख्या	२		२
४	rustic store निर्माण	संख्या		२	२
५	प्रशोधन उद्योग	संख्या		२	२
६	चिलिङ्ग भ्यान- माछा	संख्या	२	२	
७	कोल्ड store निर्माणाधीन	संख्या	२	९	११ दड

# प्रतिवेदन अवधिसम्म सम्पन्न मूल्य मूल्य गतिविधिहरु

क्र सं	कार्यक्रम	इकाइ	आ.व. २०७४/७५ सम्म सम्पन्न प्रगति	आ.व. २०७५/७६ को प्रगति	हालसम्म प्राप्त उपलब्धि
६)	संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि				
१	माटो तथा बाली संरक्षण मिनिल्याब	संख्या	६	६	६
२	माटो परिक्षण मोबाइल भ्यान खरिद	संख्या	४	४	८
३	खाद्य परिक्षण मोबाइल भ्यान खरिद	संख्या	२	२	४
४	कृषि इन्टर्न विवाह	संख्या	२५७	१८५	४४२

# परियोजना व्यवस्थापन इकाईकाबाट सम्पन्न गतिविधिहरु

## नयाँ जोन तथा सुपरजोनहरुको क्षेत्र निर्धारण

► चालु आ.व. मा विभिन्न बाली/वस्तुहरुमा ३४ वटा जोन/सुपरजोन थप भएको र नयाँ जोन तथा सुपरजोनहरुको कार्यक्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा संखुवासभा, झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, कपिलवस्तु, चितवन, नवलपरासी(पुर्व), बैतडी, मुस्ताङ, बागलुङ, म्याग्दी, ईलाम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा, रुकुम(पुर्व), भोजपुर, ईलाम, पांचथर, मनाङ, सोलुखुम्बु, दोलखा, कालिकोट, गुल्मी जिल्लाहरुमा जोनको कार्य क्षेत्र निर्धारणको लागि प्राविधिक कार्ययदलले सिफारिस गरि आ.व. २०७५/७६ सम्म ६९ जोन र १४ सुपरजोन गरि जम्मा ८३ जोन/सुपरजोन संचालनका लागि स्वीकृत भएको ।

# परियोजना व्यवस्थापन इकाईकाबाट सम्पन्न गतिविधिहरू

कृषि स्नातक ईन्टर्न करार र कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम

कृषि स्नातक ईन्टर्न करार र कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम कृषि स्नातक ईन्टर्न करार र कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम कृषि स्नातक ईन्टर्न करार र कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मिति २०७५। ६। १२ मा आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना प्रकाशन भई प्राप्त आशय पत्र मुल्यांकन गरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको महेन्द्ररत्न कृषि क्याम्पस र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय छनौटमा परि सम्झौता भएर १८५ जना कृषि ईन्टर्नहरू परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा परिचालन गरिएका छन्।

# परियोजना व्यवस्थापन इकाईकाबाट सम्पन्न गतिविधिहरु

## शित भण्डार गृह स्थापना

परियोजना व्यवस्थापन इकाई अन्तर्गत प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजि कम्पनी सँग साझेदारीमा देशका विभिन्न ११ जिल्लाहरुका ११ स्थानमा नयाँ शित भण्डार गृह स्थापना गर्नका लागि मिति २०७५/०६/२३ मा प्रस्ताव आवहन सूचना प्रकाशन भई प्राप्त प्रस्तावहरुको मूल्यांकनको क्रममा स्थलगत प्रमाणीकरण टोलि खटिएर स्थलगत प्रमाणीकरण टोलि खटिई २०७५/०९/२७ मा प्रस्ताव स्विकृतिको लागि आशय पत्र को सूचना प्रकाशन गरि हाल ११ वटा निजि कम्पनि संग सम्झौता भइ बाँकि निजि कम्पनी सँग शित भण्डार गृह निर्माणका लागि सम्झौताको क्रममा रहेको।

क्रियाकलाप	लक्ष्य	प्रगति	सम्झौता
शित भण्डार गृह स्थापना	१३	१३	११

# बेरुजु तथा राजस्व विवरण (रु.हजारमा)

परियोजना	कुल बेरुजू रकम	बेरुजू फछौट
	रकम	प्रतिशत
परियोजना व्यवस्थापन इकाई	५८८०७२	४०००००
परियोजना कार्यान्वयन इकाई	५५१५५	१११५८
जम्मा	६४३२२७	४१११५८

परियोजना व्यवस्थापन इकाई को राजस्व : रु ४८,७००/-

परियोजना कार्यान्वयन इकाई को राजस्व : रु ३,८५,०००/-

प्रगति नपुणका कारणहरू

# प्रगति नपुग क्रियाकलापहरू

क्रियाकलापहरू	बार्षिक लक्ष्य	प्रगति	प्रगति नपुग	प्रगति नपुगका जायज कारण
सघन स्याउ रोपण कार्यक्रम	१	०	१	प्राप्त प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको हुँदा खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको।
शित स्थापना	१३	१३	२	११ वटा निजि कम्पनी सँग शित भण्डार गृह निर्माणका लागि सम्झौता भइ कार्य भइ रहेको।
क्यानिड प्याकेजीड स्थापना कार्यक्रम	१	०	१	तेश्रो पटकसम्म सुचना प्रकाशन गर्दा पनि सारभूत रूपमा प्रभावग्राही आशय पत्रहरू प्राप्त नभएको
मूल्य बालीहरूको तथ्यांक अध्ययन/सर्वेक्षण शृंखला आधारभूत तयारीको लागि	१	०	१	प्राविधिक कारणाले सम्झौता गर्न नसकिएको

# प्रगति नपुग क्रियाकलापहरू

क्रियाकलापहरू	बार्षिक लक्ष्य	प्रगति	प्रगति नपुग	प्रगति नपुगका जायज कारण
कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम	१	०	१	सारभूत रूपमा प्रभावग्राही आशय पत्रहरू प्राप्त नभएको
प्रधानमन्त्री आधुनिकिकरण परियोजनाको Unit स्थापना	कृषि Focal	७	०	मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश भएको
Agriculture Monitoring Information System Software निर्माण तथा सञ्चालन	Result	१	०	सारभूत रूपमा प्रभावग्राही आशय पत्रहरू प्राप्त नभएको

# प्रगति नपुग क्रियाकलापहरू

क्रियाकलापहरू	बार्षिक लक्ष्य	प्रगति	प्रगति नपुग	प्रगति नपुगका जायज कारण
सहकारीसंग सहकार्यमा स्थानीय प्राकृतिक निर्माण(पोष्ट सेवा)	१	०	१	कार्य सम्पन्न हुन बाँकी
युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम	१	०	१	प्राविधिक कारणले

# प्रगति नपुग क्रियाकलापहरू

क्रियाकलापहरू

बार्षिक

प्रगति नपुग

प्रगति नपुगका जायज  
कारण

लक्ष्य प्रगति

चुरे भावर सघन  
फलफूल खेती

१० ०

१०

सारभूत रूपमा प्रभावग्राही  
आशय पत्रहरू प्राप्त  
नभएको

सामुदायिक कृषि फार्म  
स्थापन

३ ०

३

सारभूत रूपमा प्रभावग्राही  
आशय पत्रहरू प्राप्त  
नभएको

साइलो (कृषि उपज  
भण्डार गृह) निर्माण

४ ०

४

कार्यक्रम संशोधन समय  
हुन नसकेको

# अनुदान र सहभागिताको विवरण (रु.हजारमा)

परियोजना	कुल अनुदान रकम	अनुदान खर्च र सहभागिता
		अनुदान प्रतिशत सहभागिता
परियोजना व्यवस्थापन इकाई	११०४३८३	२६१६३३ २३.६९
परियोजना कार्यान्वयन इकाई	९७८१९७	८९९९४१ ९१.९१ ४९२८९
जम्मा	२०८२५८०	११६१५७४ ५५.७७

# परियोजनाको सहजिकरणमा देखिएका समस्याहरू

समस्याको किसिम कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य  
....समस्याहरू समाधानका प्रयासहरू

क) नीतिगत

१. बहुसरोकारवाल निकायसँग<sup>1</sup>  
समन्वयमा कठिनाइ

२. परियोजना अनुसार खर्च सीमा बारे  
कार्यविधीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको

३. संचालक समिति मार्फत कार्यक्रम  
संचालन हुने व्यवस्था भएकोमा विभिन्न  
समुदायमा लक्षित कार्यक्रम एकरूपता  
ल्याइ प्रभावकारीरूपमा संचालन गर्न  
कठिनाइ

४. परियोजना दस्तावेजमा भएको  
व्यवस्था बमोजिम कार्यविधीहरू  
नभएको

# परियोजनाको सहजिकरणमा देखिएका समस्याहरू

समस्याको किसिम कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समाधानका प्रयासहरू  
....समस्याहरू

## ख) प्राविधिक

१. भौगोलिक क्षेत्र, बाली र स्थान  
विशेषका आधारमा कषि  
यान्त्रिकीकरणाका लागि कष्टम हायरिंग  
सेवाको व्यवस्था नभएको

२. प्रत्येक पकेट संचालक समिति  
गठन गरि कार्यक्रम संचालनमा  
कठिनाइ

## ग) व्यवस्थापकीय

१. कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थायित्वमा  
समस्या

२. कार्यक्रम संचालन खर्च बढी लाग्ने  
भएको र जनशाक्ती व्यवस्थामा समस्या

प्रतिवेदन अवधिमा संचालित कार्यक्रमहरूको  
मुख्य मुख्य उपलब्धि  
(सुचक सहित)

**प्रतिवेदन अवधिमा संचालित कार्यक्रमहरूको मुख्य मुख्य उपलब्धी  
(सुचक सहित)**

अपेक्षित उपलब्धी नं. १	हासिल भएको उपलब्धी	
	प्रगति	क्षेत्रफल विस्तार
आ.व. २०७५/७६ मा थप हुन पर्ने जोन/सुपर जोन कार्यक्रम		
१४३३ साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेटहरू)	७५३ पकेट थप भएको	४७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल थप विस्तार भई आ.व. ०७५/७६ सम्म जम्मा १ लाख ९ हजार हेक्टर परियोजनाले समेटेको।
१५० व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक)	१९० ब्लक थप भएको	
३४ कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन)	३० जोन थप भएको	
१ वटा बहुत कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्र (सुपर जोन) स्थापना भएको हुनेछ	४ सुपरजोन थप भएको	
	२२ वटा जोन/सुपर जोन कार्यक्रम थप भएको	

## प्रतिवेदन अवधिमा संचालित कार्यक्रमहरूको मुख्य मुख्य उपलब्धी (सुचक सहित)

अपेक्षित उपलब्धी नं. २	हासिल भएको उपलब्धी
आगामी ३ बर्ष भित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू (धान, गहु, मकै) मा, आगामी २ बर्ष भित्र तरकारी बालीर माघामा र ७ बर्ष भित्र प्रमुख फलफूल बालिमा आत्मनिर्भर भएको हुनेछ।	परियोजनाका ४ वटै सम्भाग अन्तर्गत करीब १ लाख हेक्टरमा विभिन्न २२ वटा बाली वस्तु मूल्य शृंखला प्रबद्धनमा क्षेत्र विस्तार भई आत्मनिर्भरता तर्फ अघि बढेको।
अपेक्षित उपलब्धी नं. ३	हासिल भएको उपलब्धी
परियोजनाको प्रथम वर्षमा करिब ८ लाख ७० हजार आंशिक र ४३ हजार ५०० स्थाई रोजगारी सृजना भएको हुनेछ। परियोजनाको अन्तिम वर्षमा करिब ५ लाख १० हजार आंशिक र २५ हजार ५०० स्थाई रोजगारीको संख्या कायम रहनेछ।	जिल्लागत रूपमा परियोजनाका विभिन्न सम्भाग अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरूको सम्पूर्ण तथ्याङ्क आइनसकेको साथै यस सम्बन्धमा छुट्टै अध्ययन/सर्वेक्षण नभएको।
अपेक्षित उपलब्धी नं. ४	हासिल भएको उपलब्धी
हालको मूल्यमा परियोजना अवधिभरमा कुल लगानी करिव रु. १ खर्व ३० अर्वाट मूल्य अभिवृद्धि सहित करिव रु. २० खर्व ९५ अर्व ७५ करोड मूल्य बरावरको रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पूँगेको हुनेछ जसबाट कृषि विकास रणनीतिको पहिलो १० बर्षको लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने छ।	परियोजनाको mid term evaluation को क्रममा मात्र परियोजनाको तर्फबाट GDP मा हुने योगदानको यकिन गर्न सकिने

# परियोजनाको जनशक्तिको विवरण

स्वीकृत पद/ श्रेणी	परियोजना व्यवस्थापन इकाइ (१)		सुपरजोन कार्यान्वयन इकाइ (१४)		जोन कार्यान्वयन इकाइ (६९)	
	दरबन्दी	रिक्त	दरबन्दी	रिक्त	दरबन्दी	रिक्त
परियोजना निर्देशक	१	०	०	०	०	०
बरिष्ठ कृषि अधिकृत	४	१	१४	०	६९	२६
उप सचिव (लेखा)	१	०	०	०	०	०
कृषि अधिकृत	४	२	१४	६	६९	३५
खाद्य अनुसन्धान अधिकृत	०	०	८	०	०	०
नायब/प्राविधिक सहायक	३	३	२८	१७	१३८	९७
सब-इन्जिनियर	१	१	०	०	०	०
लेखापाल/सह लेखापाल	१	०	१४	८	६९	४५
ना.सु. /खरिदार	२	०	१४	१२	६९	५८
क्यामरा मेन	१	०	०	०	०	०
कम्प्युटर सहायक	४	०	३	०	०	०
हलुका सवारी चालक	७	०	१४	०	५१	५१
कार्यालय सहयोगी	४	०	२८	०	१३८	०
जम्मा	३३	७	१३७	४३	६०३	२६१

# पद पूर्तिको स्थिती

जम्मा पद पूर्ति जनशक्ती

५९ प्रतिशत

प्राविधिक जनशक्ती पदपूर्ति

४४ प्रतिशत

# परियोजनाका कार्यक्रमका झलकहरु



परियोजना व्यवस्थापन इकाई, योजना तर्जुमा गोष्ठी

# परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कार्यक्रमका झलकहरु

कष्टम हाईरिङ सेन्टर



मकै जोन धादिङ

तरकारी जोन नुवाकोट

# परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कार्यक्रमका झलकहरु

## कष्टम हाईरिङ सेन्टर



तरकारी जोन मकवानपुर



धान सुपर जोन बर्दिया



# परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कार्यक्रमका झलकहरु

## साना सिंचाई



धान जोन प्युठान



तरकारी जोन धादिङ

# परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कार्यक्रमका झलकहरु

## पोष्ट हर्भेट



धान सुपर जोन कपिलवस्तु



मकै जोन धादिङ

# परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कार्यक्रमका झलकहरु

## मत्स्य पोखरी निर्माण



मत्स्य जोन रूपन्देहि



मत्स्य सुपर जोन बारा

# परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कार्यक्रमका झलकहरु

सेमी हाईटेक नसरी



तरकारी जोन अर्धाखाची



तरकारी जोन मकवानपुर

# परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कार्यक्रमका झलकहरु

## अलैंची सम्बन्धि



लमजुङ, संखुवासभा, पांचथर जोन सुधारिएको भट्टी

# परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कार्यक्रमका झलकहरु

अन्य कार्यक्रमगत



आलु सुपर जोन डेलधुरा



आलु सुपर जोन काभ्रे

# परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कार्यक्रमका झलकहरु

## अन्य कार्यक्रमगत



धान सुपर जोन झापा



धान जोन कंचनपुर

# परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कार्यक्रमका झलकहरु



प्राविधिक वर्तालापको दृश्य

# परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कार्यक्रमका झलकहरु



तरकारी जोन धनकुटा




साना सिंचाई कार्यक्रम अन्तर्गत शिवपुरी -०६ मा सिंचाई कुलो मर्मत



बनदेवी कृषि फर्म, पञ्चकन्या -०३

प्लास्टिक पोखरी निर्माण

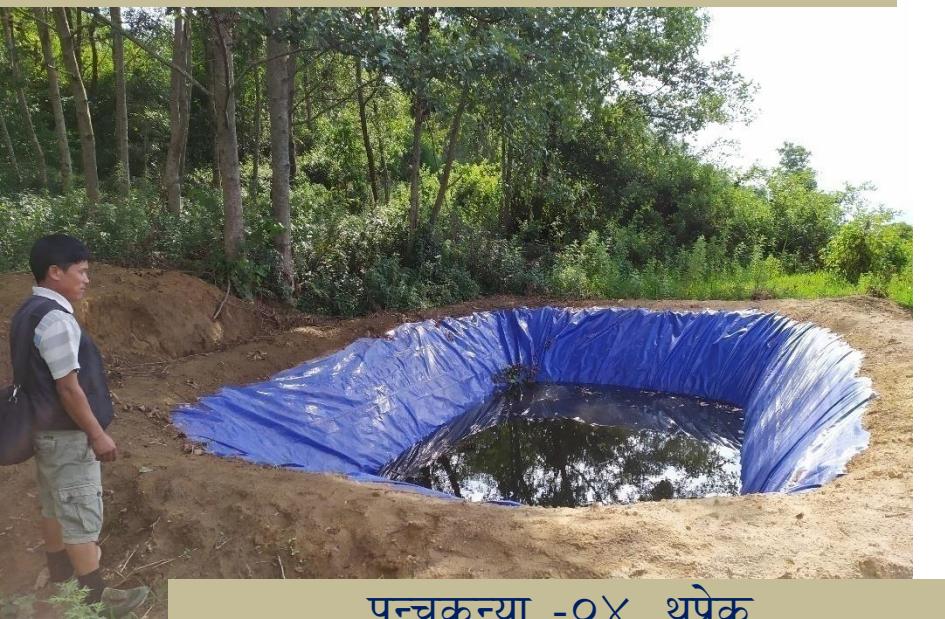

पञ्चकन्या -०४, थप्रेक

# परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कार्यक्रमका झलकहरू



धन्यवाद

